PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4
www.proznak.cz, e-mail: proznak@proznak.cz
tel., fax: 2 444 66 444; 2 44 46 47 48

Dopravní značení Vybavení komunikací Lanová svodidla

[redacted]

Příloha k č. j. MD-54087/2025-940/4 ze dne 25. 9. 2025

[redacted]

Stavba : **D0 – Oprava mostních závěrů na mostech ev. č. D0-179..1 a D0-179..2**

Etapa: **Fáze 3 a Fáze 4**

[redacted]

V rámci přechodné úpravy provozu pro Fázi 3 a Fázi 4 bude provedena opravy mostních závěrů na mostech ev. č. D0-179..2.

Rozsah uzavírky a její termíny:

Přestavba DIO na Fázi 3:

Od Út. 30.9. 20:00 hod. do St. 1.10. 6:00 hod. a od St. 1.10. 20:00 hod. do Čt. 2.10. 6:00 hod. bude v pravém jízdním pásu od km 2,860 po km 4,350 dle potřeb stavby střídavě uzavírán levý, nebo pravý jízdní pruh dle schémat ŘSD DK 237 a DK 247. V levém jízdním pásu od km 4,750 po km 3,300 bude dle potřeb stavby střídavě uzavírán levý, nebo pravý jízdní pruh dle schémat ŘSD DK 237 a DK 247. Doprava bude vedena systéme 1/1. Důvodem je provedení provizorního VDZ a výstavba dopravního opatření Fáze3.
V mezidobí ve St. 1.10. od 6:00 hod. do 20:00 hod. bude v pravém jízdním pásu od km 2,860 po km 4,350 bude uzavřen levý jízdní pruh. Doprava bude vedena dvěma pomocnými jízdními pruhy vpravo. V levém jízdním pásu od km 4,750 po km 3,3,300 bude uzavřen levý jízdní pruh. Doprava bude vedena dvěma pomocnými jízdními pruhy vpravo.

DIO Fáze 3:

Od Čt. 2.10. 6:00 hod. do Čt. 9.10.20:00 hod. bude v pravém jízdním pásu v km 3,500 – 4,205 uzavřen levý jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu. Doprava bude vedena systémem 2+1/1.

Přestavba DIO z Fáze 3 na Fázi 4:

Od Čt. 9.10. 20:00 hod. do Pá. 10.10. 6:00 hod. bude v pravém jízdním pásu od km 4,235 po km 3,400 dle potřeb stavby střídavě uzavírán levý, nebo pravý jízdní pruh dle schémat ŘSD DK 237 a DK 247. Důvodem je výstavba dopravního opatření Fáze 4.

DIO Fáze 4:

Od Pá. 10.10. 6:00 hod. do St. 15.10.20:00 hod. bude v pravém jízdním pásu v km 3,500 – 4,205 uzavřen odstavný pruh a pravý jízdní pruh. Doprava bude vedena systémem 2+1/1

Demontáž DIO na Fázi 4:

Od St. 15.10. 20:00 hod. do Čt. 16.10.6:00 hod. a od Čt. 16.10. 20:00 hod. do Pá. 17.10. 6:00 hod. bude v pravém jízdním pásu od km 3,300 po km 4,350 dle potřeb stavby střídavě uzavírán levý, nebo pravý jízdní pruh dle schémat ŘSD DK 237 a DK 247. V levém jízdním pásu od km 4,750 po km 3,3,300 bude dle potřeb stavby střídavě uzavírán levý, nebo pravý jízdní pruh dle schémat ŘSD DK 237 a DK 247. Doprava bude vedena systéme 1/1. Důvodem je provedení provizorního VDZ a výstavba dopravního opatření Fáze3.

V mezidobí ve Čt. 16.10. od 6:00 hod. do 20:00 hod. bude v levém jízdním pásu od km 4,750 po km 3,3,300 bude uzavřen levý jízdní pruh. Doprava bude vedena dvěma pomocnými jízdními pruhy vpravo.

[redacted]

Přechodné dopravní značení bude provedeno a umístěno dle PPK-PRE a Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydaných ŘSD. Termíny uzavírek budou stanoveny v rozhodnutí o povolení uzavírky.

Přestavba DIO na Fázi 3 - část 1 DK 237

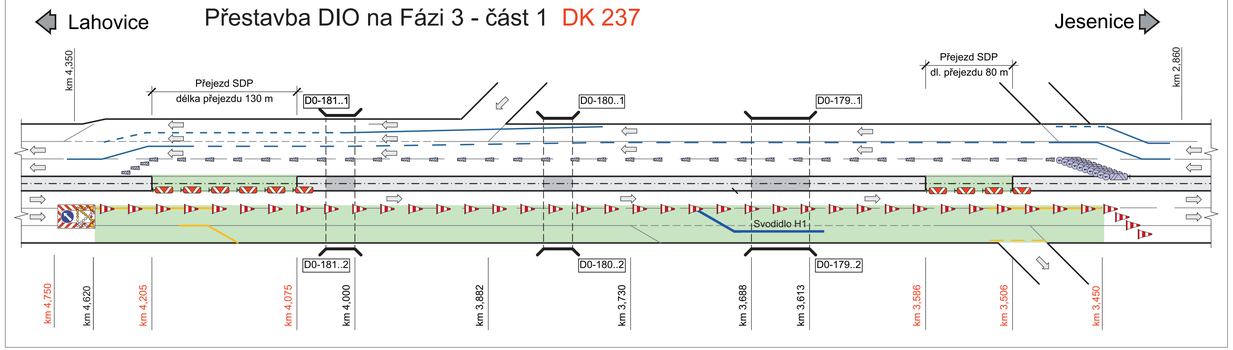

Přestavba DIO na Fázi 3 - část Mezidobí, provoz veden 2/2

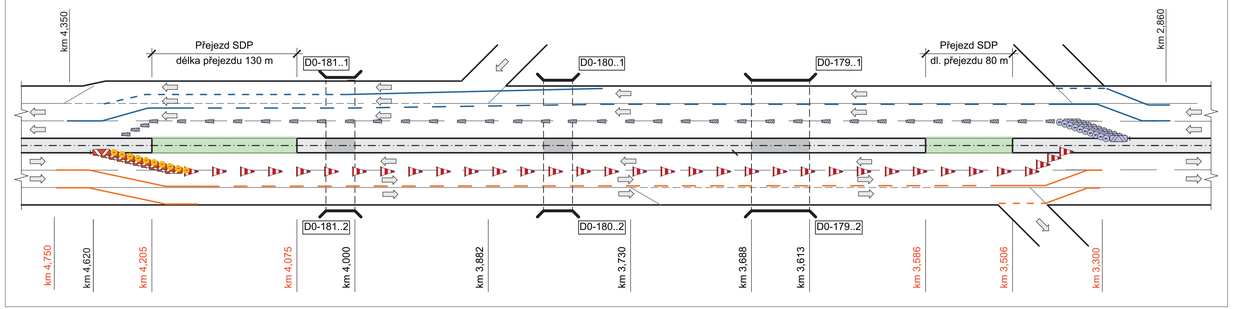

Přestavba DIO na Fázi 3 - část 2 DK 237
Přestavba DIO na Fázi 4 - část 2 DK 237

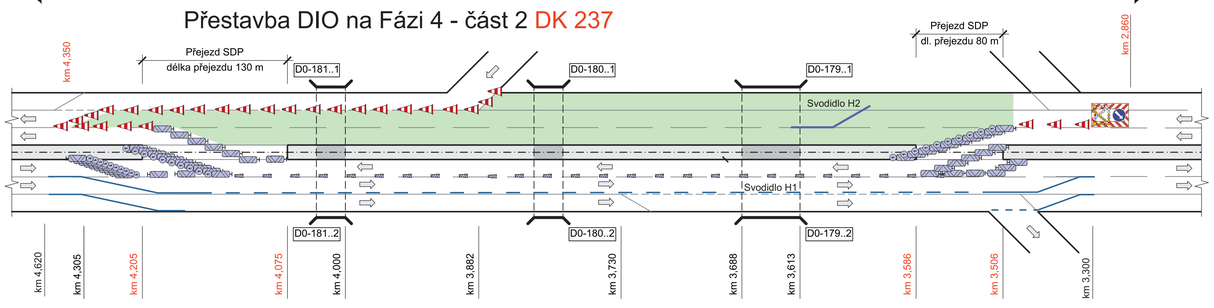

PROZNAK

VYPRACOVAL: Michal Pařízek	SCHVÁLIL: Slavo Glatz	REGION: Praha / OBVOD: Praha západ	PROZNAK, Praha s.r.o. Pikovická 244/17, Praha 4, 147 00 tel + fax : 2 444 66 444 www.proznak.cz e-mail: projekt@proznak.cz projekce: parizek@proznak.cz
INVESTOR: ŘSD ČR s.p., Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA			
OBJEDNATEL DIO: ŘSD ČR s.p., Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA		DATUM: 11/09/2025	STUPEŇ: DIR
AKCE: Dálnice D 0, km 3,613 - 3,688 Oprava mostních závěrů na mostech ev. č. D0 - 179..1 a D0-179..2		ZAKÁZKA Č.: 250300	
OBJEKT: Dopravní značení a opatření		ČÁST: Přestavba DIO na Fázi 3 a 4	

Demontáž Fáze 4 - část 1 DK 237

Lahovice — Jesenice



Demontáž Fáze 4 - část Mezidobí, provoz veden 2/2

Lahovice — Jesenice



Demontáž Fáze 4 - část 2 DK 247

Lahovice — Jesenice



Demontáž Fáze 4 - část 3, DK 237

Lahovice — Jesenice



PROZNAK

VYPRACOVAL: Michal Pařízek	SCHVÁLIL: Slavo Glatz	REGION: Praha OBVOD: Praha západ	PROZNAK, Praha s.r.o. Pějovická 244/17, Praha 4, 147 00 tel + fax : 2 444 66 444 www.proznak.cz e-mail: projekt@proznak.cz projekce: parizek@proznak.cz
INVESTOR: ŘSD ČR s.p., Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA			
OBJEDNATEL DIO: ŘSD ČR s.p., Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA		DATUM: 11/09/2025	STUPEŇ: DIR
AKCE: Dálnice D 0, km 3,613 - 3,688 Oprava mostních závěrů na mostech ev. č. D0 - 179..1 a D0-179..2		ZAKÁZKA Č.: 250300	
OBJEKT: *Dopravní značení a opatření*		ČÁST: Demontáž DIO Fáze 4	


7.0
6.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
1.5
0.5
0.0
Rua 9 a planejar - Faixa 3
Rua 9 na reurb - Faixa 3
DIRECTRIZ
LEGENDA
PRACIGAM PROJETAR
ETAPA 02 IMÓ
PRÉ-MOLDE IMÓ
ETAPA 01 IMÓ
PRÉ-MOLDE VIÁ
PROGEO


7.0
6.5
5.0
4.5
4.0
3.0
0.0
1.5
0.5
Rua B-a-planeamento - Fase 4
Rua A-a-reabilitar - Fase 4
LEGENDA
PAVIMENTO PREVISTO
ESTRADA NO
PREVIMENTO NO
ESTRADA NO
PREVIMENTO NO
