



Železniční most pod Vyšehradem

Závěry z dokumentu HIA a z Poradní mise UNESCO v Praze

Stanovisko poradní mise složené ze zástupců UNESCO a ICOMOS International


- Ocelový most přes řeku Vltavu by měl být zachován
- Třetí kolej by měla být vedena po novém mostě s plochou mostovkou
- Umístění nové zastávky by mělo být předmětem dalšího zkoumání (zvážit přesun k nádraží Vyšehrad)

Závěry a doporučení HIA (zpracovatel prof. Michael Kloos)

- Využít HIA k posouzení dalších alternativních variant
- Připravit zadání pro nový most (3. kolej) a uspořádat mezinárodní soutěž
- Využít nový návrh zachování stávajícího mostu na místě k přehodnocení současného řešení zastávky na Výtoni (zvážit posun k Vyšehradu)
- Integrovat další projekty na Smíchovském břehu do posouzení HIA
- Pokračovat v participativním procesu se všemi Stakeholdery

1. ETAPA - Přeložky sítí a vložení mostního provizoria

- Dokončení geologických a stavebně-technických průzkumů v souvislosti s přeložkami sítí a rekonstrukcemi stávajících mostů
- Zpracování projektové dokumentace na vymístění a přeložky inženýrských sítí plynu, PRE, CETIN, drážních sítí (probíhá)
- Projednání dokumentace na vymístění a přeložky sítí s DOSS
- Žádost o povolení záměru na vymístění a přeložky sítí
- Povolení záměru na vymístění a přeložky sítí (DESÚ)
- Realizace vymístění a přeložek
- Zpracování projektu mostního provizoria
- Povolení záměru na vložení mostního provizoria (DESÚ)
- Vložení mostního provizoria

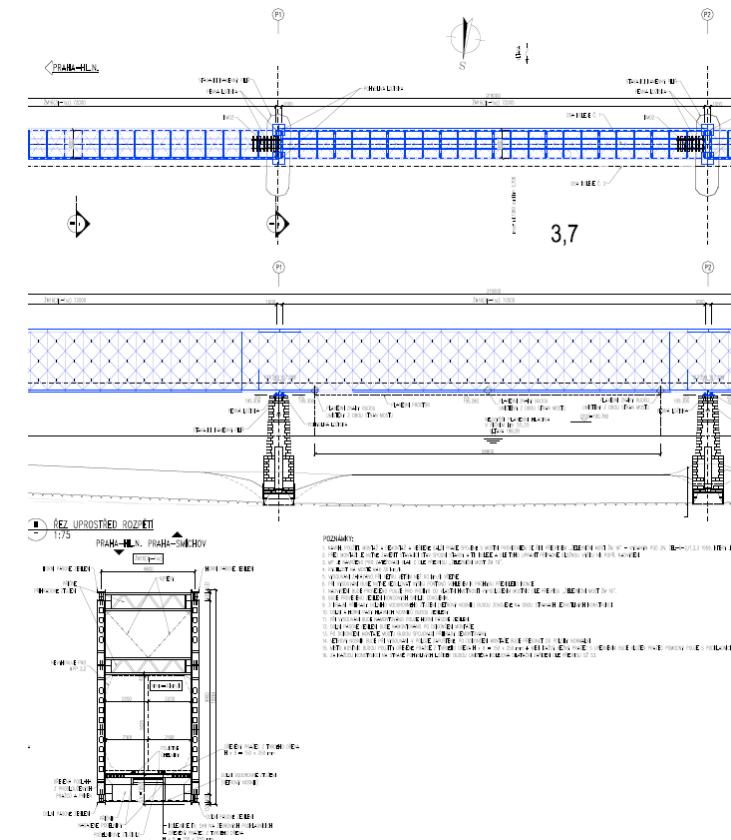

2. ETAPA - Rekonstrukce stávajících konstrukcí, nový most pro třetí kolej, dopravní uzel Výtoň

- Příprava podkladů a zadávací dokumentace pro novou mezinárodní architektonickou soutěž řešící ponechání stávající mostní konstrukce, nového mostu pro třetí kolej a dopravní uzel Výtoň
- **Mezinárodní architektonická soutěž** včetně zajištění projekčních prací
- Zpracování projektu rekonstrukce stávajícího mostu včetně návrhu nového mostu pro třetí kolej a dopravní uzel na Výtoni
- Povolení záměru na nový most, rekonstrukci stávajícího mostu a lokalitu Výtoně
- Realizace výše uvedeného záměru



Harmonogram dalšího plánovaného postupu

Aktivita	Zpracovatel	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032			
		09	10	11	12	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Etapa I. - přeložky sítí a vložení mostního provizoria																																	
Předložení stanoviska HIA	prof.Kloose/Správa železnic																																
Rozhodnutí o dalším postupu ve vztahu ke stávajícímu mostu	Ministerstvo dopravy																																
Geologické a stavebně-technické průzkumy	SUDOP Praha a.s.																																
Zasmluvnění projektu mostního provizoria	Správa železnic																																
Dokončení projektové dokumentace na vymístění a přeložky inženýrských sítí	SUDOP Praha a.s.																																
Projednání dokumentace na vymístění a přeložky sítí s DOSS	SUDOP Praha a.s./Správa železnic																																
Povolení záměru na vymístění a přeložky sítí	Dopravní a energetický stavební úřad																																
Tendr na realizaci vymístění a přeložek sítí	Správa železnic																																
Realizace vymístění a přeložek sítí	Vysoutěžený zhotovitel																																
Projekt mostního provizoria	Vysoutěžený projektant																																
Povolení záměru mostního provizoria	Správa železnic																																
Tendr na vložení mostního provizoria	Dopravní a energetický stavební úřad																																
Vložení mostního provizoria	Vysoutěžený zhotovitel																																
Etapa II. - Rekonstrukce stávajících konstrukcí, nový most, lokalita Výtoň																																	
Příprava podkladů a zadávací dokumentace pro architektonickou soutěž	Správa železnic																																
Mezinárodní architektonická soutěž, výběr vítězného návrhu (včetně mezinárodní soutěže na zpracovatele projektu)	Správa železnic																																
Zpracování projektu nového mostu včetně rekonstrukce stávajícího mostu a řešení dopravního terminálu Výtoň	Vítězný projektant																																
Tendr na zhotovitele nového mostu včetně rekonstrukce stávajícího mostu a řešení dopravního terminálu Výtoň	Správa železnic																																
Povolení záměru na nový most, rekonstrukci stávajícího mostu a lokalitu Výtoně	Dopravní a energetický stavební úřad																																
Realizace stavby	Vysoutěžený zhotovitel																																



Děkujeme za pozornost
